
แผนการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา

ระดับน้ำเหนือเขื่อน · น้ำขึ้นลงสันดอน · สะพานพระราม 8 · 16–25 ต.ค. 2569


ข้อมูล ณ 16 ต.ค. 2569 · 14:40 น.

ONE RID


1 อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)

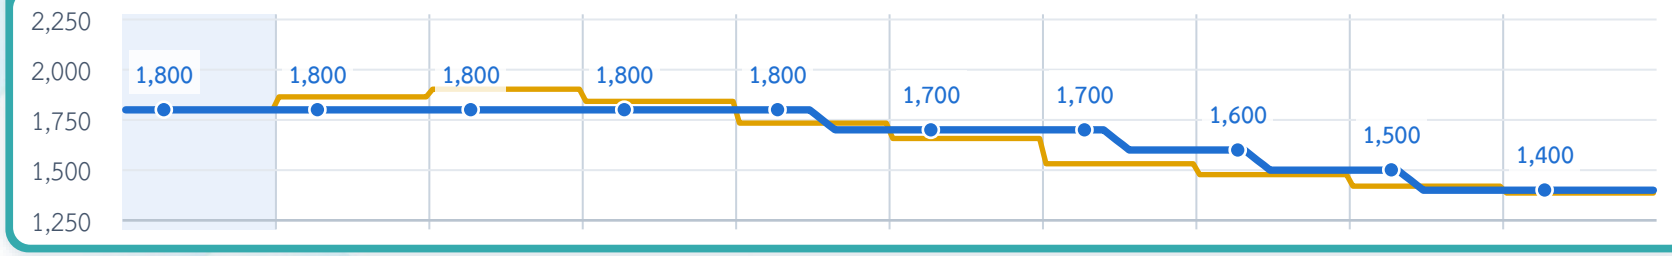

2 ระดับน้ำเหนือเขื่อน (ม.รทก.)

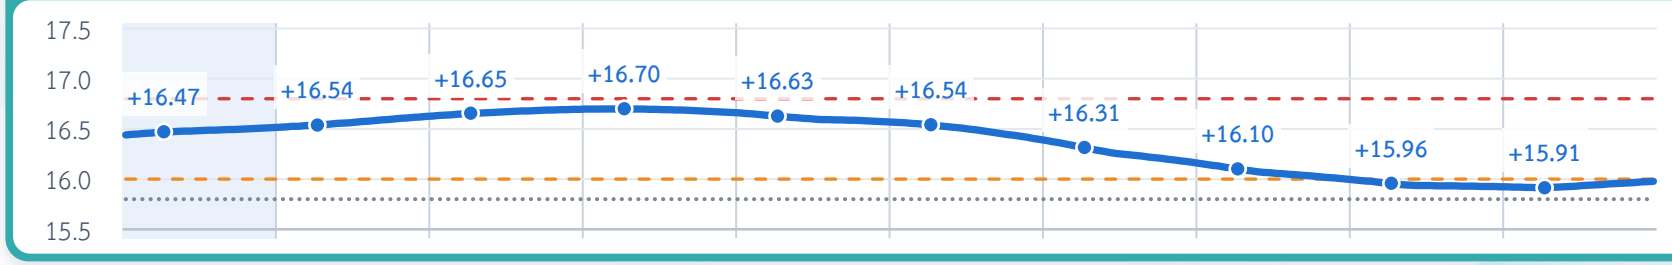

3 สะพานพระราม 8 และสันดอน (ม.รทก.)

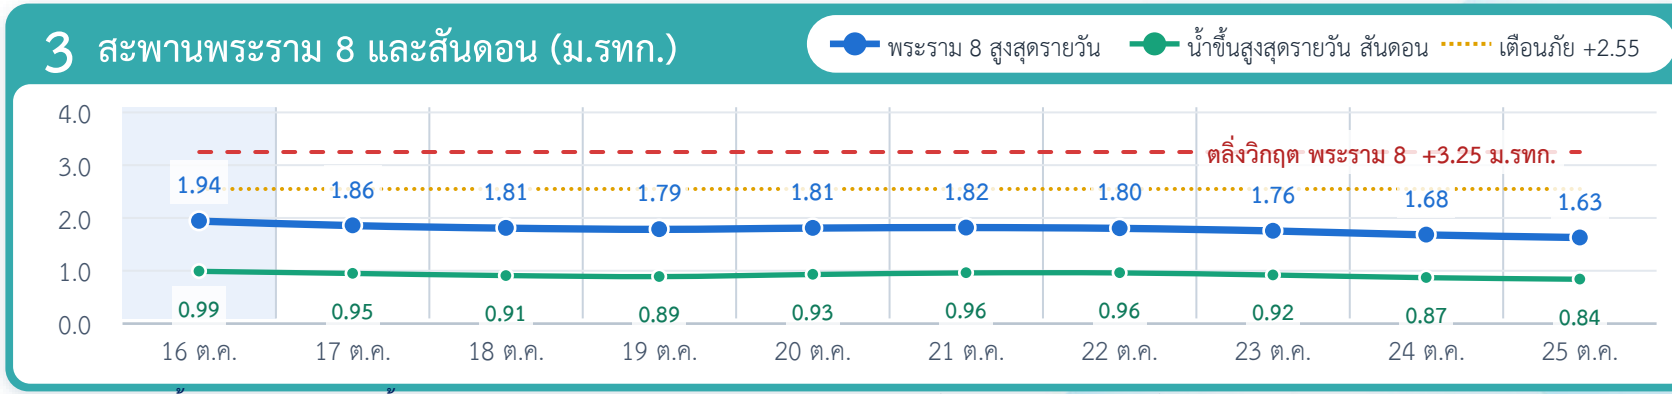

สรุปสถานการณ์และแผนการระบาย

1 อัตราการไหล

- น้ำเหนือที่ C.2 และสะแกกรังมีแนวโน้มลดลง (C.2 จาก 1,651 เหลือราว 1,300 ลบ.ม./วินาที)
- คงระบาย 1,800 ลบ.ม./วินาที ถึง 20 ต.ค. 69 แล้วทยอยปรับลดตามสถานการณ์

2 ระดับน้ำเหนือเขื่อน

- ยังมีน้ำเท้อหน้าเขื่อน (+16.47) จึงลดระดับลงสู่ประมาณ +15.80 ม.รทก.
- เพิ่มพื้นที่ว่างหน้าเขื่อน รองรับปริมาณน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่ม

3 สะพานพระราม 8

- สูงสุด +1.94 ม.รทก. (16 ต.ค.) ต่ำกว่าตลิ่งวิกฤต +3.25 อยู่ 1.31 ม.

ผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำ

ปริมาณน้ำที่ระบายไม่ส่งผลกระทบพื้นที่ กทม.

ที่มา: แบบจำลองแผนการระบายเขื่อนเจ้าพระยา (V21) · ข้อมูลบันทึก 16 ต.ค. 2569 เวลา 15:13 น. · ปรับด้วยระดับเหนือเขื่อน 14:40 น. +16.49 · กราฟ 1–2 รายชั่วโมง (ป้ายตัวเลข = 06:00 น.) · กราฟ 3 = สูงสุดรายวัน


ปริมาณน้ำไหลมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยา

ก่อนและหลังหักการผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งซ้าย–ขวา · 10 ต.ค. – 25 ต.ค. 2569

ข้อมูล ณ 16 ต.ค. 2569 · 06:00 น.

ONE RID

อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)

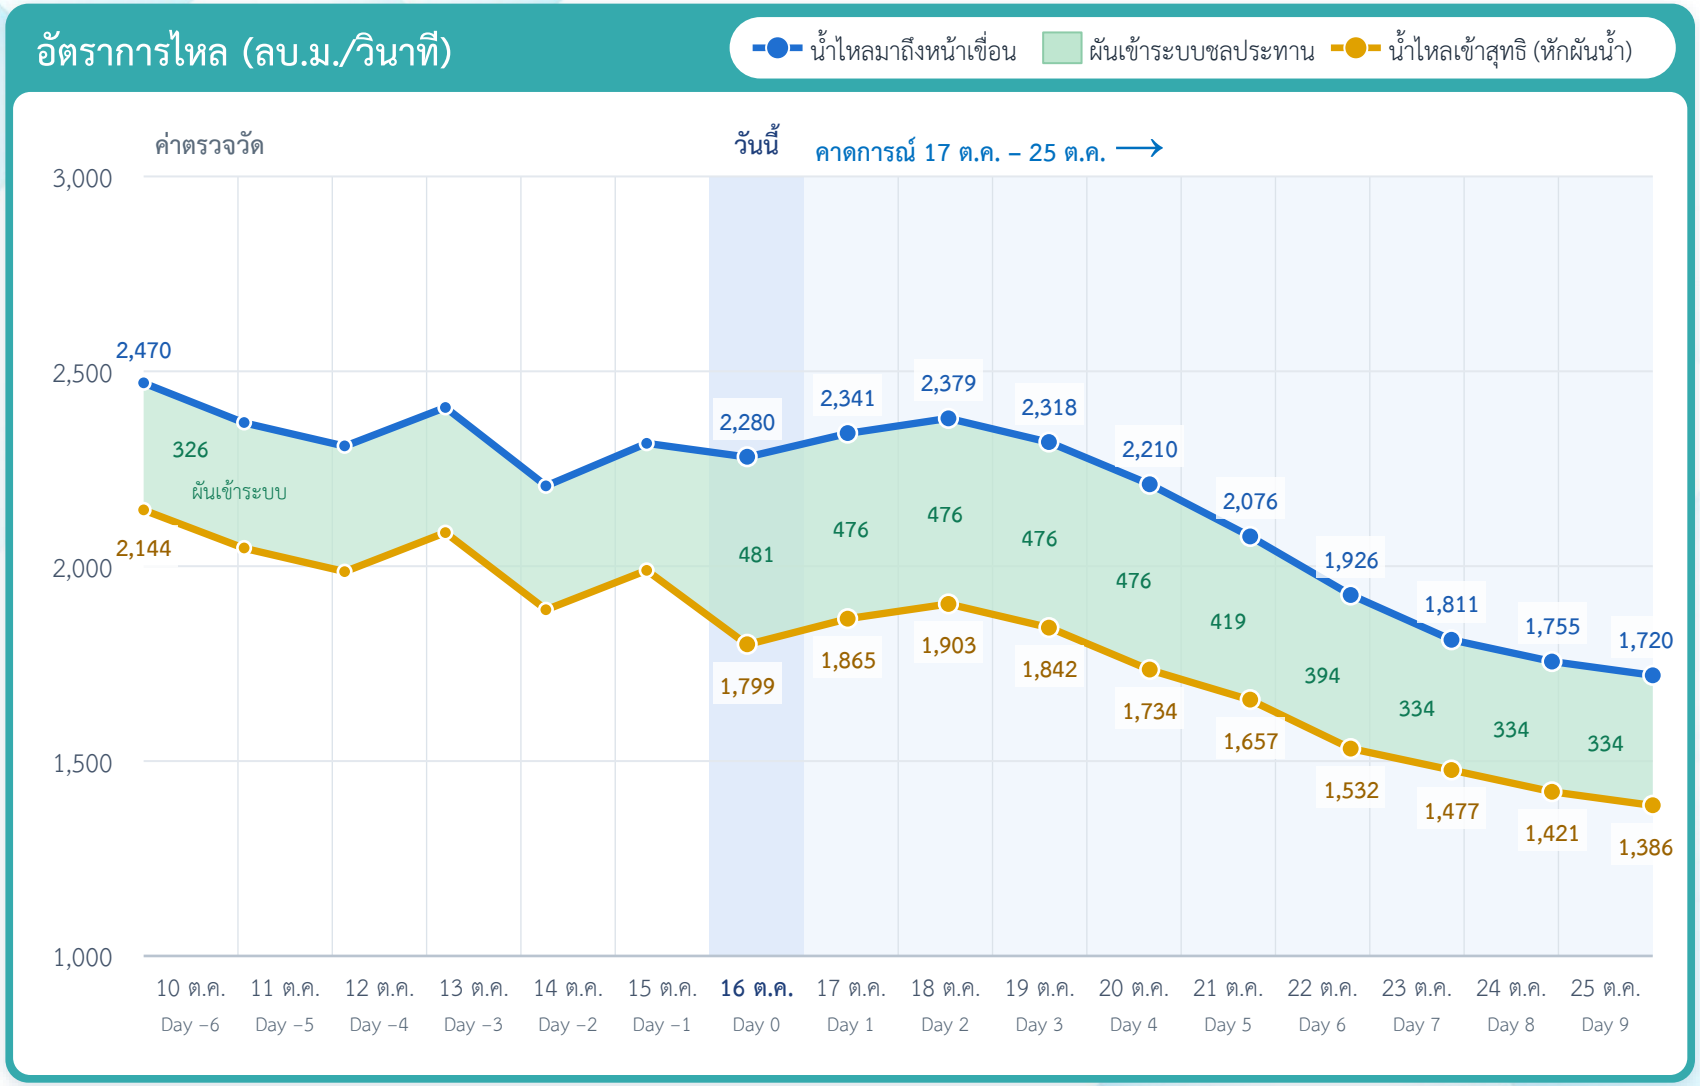

สรุปสำหรับผู้บริหาร

น้ำไหลมาถึงหน้าเขื่อน

2,280 ⟶ 1,720 ลบ.ม./วินาที

ลดลงต่อเนื่อง ต่ำสุด 1,720 (25 ต.ค.)

ผันเข้าระบบชลประทาน ซ้าย–ขวา

481 ⟶ 334 ลบ.ม./วินาที

ฝั่งซ้าย (มโนรมย์ มหาราช) 200 ⟶ 130 · ฝั่งขวา (พลเทพ บรมธาตุ มะขามเฒ่า) 223 ⟶ 149

น้ำไหลเข้าสุทธิหน้าเขื่อน

1,799 ⟶ 1,386 ลบ.ม./วินาที

สูงสุดช่วงคาดการณ์ 1,903 (18 ต.ค.) ใกล้เคียงแผนระบาย 1,800

สาระสำคัญ

น้ำไหลมาถึงหน้าเขื่อนลดลงจาก 2,280 เหลือ 1,720 ผันเข้าระบบลดเหลือราว 330 น้ำสุทธิหน้าเขื่อน 1,390–1,660 ใกล้เคียงแผนระบาย ระดับเหนือเขื่อนลดลงเหลือ +15.91 ม.รทก.

ที่มา: แบบจำลองแผนการระบายเขื่อนเจ้าพระยา (V21) · ข้อมูลบันทึก 16 ต.ค. 2569 เวลา 15:13 น. · น้ำไหลมาถึง = C.2 (12 ชม.) + สะแกกรัง (6 ชม.) + น้ำด้านข้าง · ค่ารายวัน 06:00 น.

ค่ากำหนดการบริหารจัดการน้ำ เขื่อนเจ้าพระยา

แผนระบาย · ระดับน้ำ · การผันน้ำ

ONE RID

ค่าปัจจุบัน (16 ต.ค.) และค่าคาดการณ์ตามแผน 9 วัน (17–25 ต.ค. 2569)

รายการ	ปัจจุบัน	ค่าคาดการณ์ตามแผน (Day 1–9)								
	16 ต.ค. วันนี้ · ศ.	17 ต.ค. ส. · Day 1	18 ต.ค. อา. · Day 2	19 ต.ค. จ. · Day 3	20 ต.ค. อ. · Day 4	21 ต.ค. พ. · Day 5	22 ต.ค. พฤ. · Day 6	23 ต.ค. ศ. · Day 7	24 ต.ค. ส. · Day 8	25 ต.ค. อา. · Day 9
แผนการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลบ.ม./วินาที	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,700	1,700	1,600	1,500	1,400
ระดับน้ำเหนือเขื่อน (06:00 น.) ม.รทก. · เป้าหมาย +15.80 · สูงสุด +16.80	+16.47	+16.54	+16.65	+16.70	+16.63	+16.54	+16.31	+16.10	+15.96	+15.91
ระดับน้ำสูงสุด สะพานพระราม 8 ม.รทก. · เตือนภัย +2.55 · ตลิ่งวิกฤต +3.25	+1.94 11:00 น.	+1.86 12:00 น.	+1.81 13:00 น.	+1.79 15:00 น.	+1.81 16:00 น.	+1.82 17:00 น.	+1.80 17:00 น.	+1.76 17:00 น.	+1.68 17:00 น.	+1.63 18:00 น.
การผันน้ำเข้าระบบชลประทาน ลบ.ม./วินาที · รวมทุก ปตร.	481	476	476	476	476	419	394	334	334	334
รายละเอียดการรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ณ ปตร. (ลบ.ม./วินาที)										
ปตร.มโนรมย์ ตะวันออก	145	145	145	145	145	120	100	80	80	80
ปตร.มหาราช ตะวันออก	55	55	55	55	55	55	50	50	50	50
ปตร.พลเทพ ตะวันตก	75	75	75	75	75	70	70	50	50	50
ปตร.บรมธาตุ ตะวันตก	121	120	120	120	120	100	100	80	80	80
ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง ตะวันตก	18	17	17	17	17	10	10	10	10	10
ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว ตะวันตก	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
คลองย่อย / อื่น ๆ ตะวันตก	58	55	55	55	55	55	55	55	55	55

วันที่ปรับการระบาย ค่าปัจจุบันจากค่าตรวจวัด 06:00 น.

ข้อมูลประกอบ: น้ำไหลผ่าน C.2 นครสวรรค์ 1,651 (16 ต.ค.) คาดการณ์ลดลงเหลือ 1,306–1,470 ลบ.ม./วินาที · แม่น้ำป่าสัก (เขื่อนพระรามหก) 440 → 350 ลบ.ม./วินาที

สรุปสำหรับผู้บริหาร

แผนการระบาย
คง 1,800 ถึง 20 ต.ค. แล้วทยอยลด 1,700 → 1,600 → 1,500 → 1,400 ลบ.ม./วินาที

ระดับน้ำเหนือเขื่อน
ลดจาก +16.47 สู่ประมาณ +15.8 ม.รทก. (25 ต.ค.) เพิ่มพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝน

สะพานพระราม 8
สูงสุด +1.94 ม.รทก. (16 ต.ค.) ต่ำกว่าเตือนภัย +2.55 ทุกวัน ไม่กระทบพื้นที่ กทม.

การผันน้ำเข้าระบบชลประทาน
ทยอยลดจาก 481 เหลือ 334 ลบ.ม./วินาที ตามแผนรับน้ำราย ปตร.

ที่มา: หน้ากรอกข้อมูลรายวัน แบบจำลองแผนการระบายเขื่อนเจ้าพระยา (V21) · ข้อมูลบันทึก 16 ต.ค. 2569 เวลา 15:13 น.

ระดับน้ำสูงสุดรายวัน เขตน้ำขึ้นลง


คาดการณ์ 16–25 ต.ค. 2569

C.29B · C.38 · C.22A · C.12 · สะพานพระราม 8

ระดับสูงสุดรายวัน — ระดับตลิ่ง ····· เฝ้าระวัง (ตลิ่ง − 0.30 ม.)


1 C.29B สามโคก

สูงสุด +2.63 · 16 ต.ค.




2 C.38 เมืองปทุมธานี

สูงสุด +2.36 · 16 ต.ค.

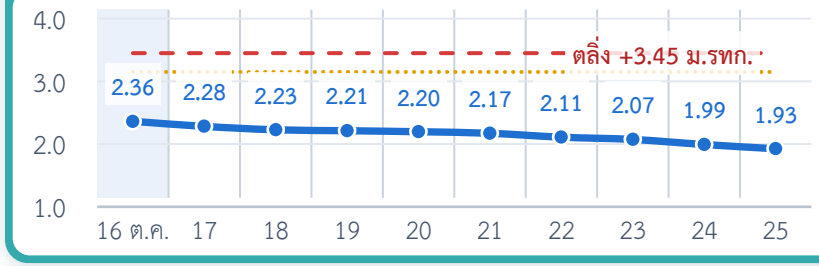


3 C.22A ปากเกร็ด

สูงสุด +2.15 · 16 ต.ค.




4 C.12 สามเสน

สูงสุด +1.94 · 16 ต.ค.

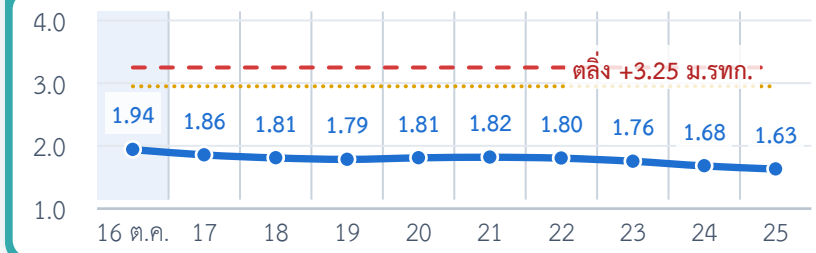

5 สะพานพระราม 8 (กทม.) · ท้ายน้ำ C.12 ≈ 3 กม.

สูงสุด +1.94 · 16 ต.ค.



สรุปสำหรับผู้บริหาร

จุดวัด	สูงสุด	ห่างตลิ่ง	สถานะ
C.29B สามโคก	+2.63	0.37 ม.	ปกติ
C.38 ปทุมธานี	+2.36	1.09 ม.	ปกติ
C.22A ปากเกร็ด	+2.15	0.75 ม.	ปกติ
C.12 สามเสน	+1.94	1.31 ม.	ปกติ
พระราม 8	+1.94	1.31 ม.	ปกติ

- ทุกจุดต่ำกว่าตลิ่งตลอด 9 วัน (16–25 ต.ค. 69)
- หลังลดการระบายตั้งแต่ 21 ต.ค. ระดับน้ำ C.29B–C.22A ลดลงตามลำดับ
- สะพานพระราม 8 สูงสุด +1.94 ม.รทก. (16 ต.ค.) ต่ำกว่าตลิ่งวิกฤต 1.31 ม. ไม่กระทบพื้นที่ กทม.

ที่มา: แบบจำลองเขตน้ำขึ้นลง (V21) ปรับด้วยค่าตรวจวัด 06:00 น. (C.29B +2.30 · C.38 +1.95 · C.22A +1.28 · C.12 +0.93) · พระราม 8 = แบบจำลอง C.12
